"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento Democracia"

Universidad Tecnológica del Perú



Proyecto MindClarity

Integrantes:

U24226203 - Cahuana Luis, Alessandro Javier

U23307050 - Cerrinos Valverde, Jordan Alexis

U24226314 - Parrales Mejía, David Jair

U24100016 - Pérez Ramírez, Darrell Jerome

U23329007 - Murga Leon, Kevin Eduardo

U22322175 - Villanueva Poma, Ronaldinho Williams

Curso:

Curso Integrador I: Sistemas Software

Docente:

Dr. Johan Max Alexander Lopez Heredia

Nuevo Chimbote

2026

Tabla de Contenido

1. Introducción 3
2. Resumen 4
3. Problematica 5
4. Justificación 5
5. Objetivos 6
   5.1. Objetivo General 6
   5.2. Objetivos Específicos 6
6. Alcance 7
   6.1. Procesos de Negocio 7
   6.2. Módulos Técnicos 8
7. Cronograma 9
   7.1. Diagrama de Gantt 9
8. Costos 10
9. Actividades o tareas 11
10. Recursos 12
   10.1. Humanos 12
   10.2. Materiales 12
11. Responsables 13
   11.1. Roles Asignados 13
   11.2. Matriz RACI 14
12. Acta de Constitución del Proyecto 15
14. Lienzo Canva 16
15. Gestión de Riesgos 17
16. Requerimientos Funcionales 18
17. Requerimientos No funcionales 20
18. Monitoreo 22
19. Prototipo del Aplicativo 23
20. Referencias Bibliográficas 25
21. Anexos 26

1. Introducción

Las instituciones educativas enfrentan hoy una necesidad creciente de detectar a tiempo señales de depresión, ansiedad y estrés en su población estudiantil. Los mecanismos tradicionales de atención psicológica en colegios, institutos y universidades dependen de citas presenciales y de un número limitado de personal especializado, y los procesos de derivación rara vez están estandarizados. El resultado es que la identificación de casos que requieren atención oportuna suele retrasarse.

MindClarity es una plataforma web de bienestar psicológico dirigida a instituciones educativas. Permite a los estudiantes realizar una autoevaluación gratuita basada en la escala clínica DASS-21, desarrollada originalmente por Sydney H. Lovibond y Peter F. Lovibond, y entrega resultados inmediatos por subescala: depresión, ansiedad y estrés. El usuario puede además dar seguimiento a su evolución emocional mediante un historial gráfico, y ser derivado hacia un especialista cuando la severidad de los resultados lo amerite.

2. Resumen

El proyecto propone desarrollar una plataforma web de bienestar psicológico dirigida a instituciones educativas, denominada MindClarity. Hoy, la detección temprana de síntomas de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes depende en buena medida de la disponibilidad de personal psicológico presencial. Esto retrasa la identificación de casos que requieren atención oportuna y limita el acceso a herramientas de autoevaluación estandarizadas y gratuitas.

La plataforma permitirá a los estudiantes registrarse, iniciar sesión y completar el cuestionario clínico DASS-21 y el sistema calcula automáticamente las puntuaciones de cada subescala y muestra una recomendación según la severidad obtenida; en los casos que lo requieran, el estudiante puede buscar y solicitar una cita con un especialista disponible. El usuario también puede consultar un historial personal con gráficos de evolución de sus resultados en el tiempo.

Las instituciones educativas contarán con una cuenta y soporte dedicados, y los especialistas tendrán un panel propio para gestionar su disponibilidad. El desarrollo se organiza bajo un enfoque de planificación PMBOK que define el inicio y fin del proyecto, los responsables de cada componente, las actividades y tareas necesarias, los costos estimados, el alcance por procesos y módulos, los recursos humanos y materiales requeridos, y el monitoreo en cada etapa.

3. Problematica

La Salud Mental es una dimension esencial del bienestar que suele se postergada, malentendida o ignorada. Hasta un 75% de los casos de transtornos mentales no reciben tratamiento oportuno debido a factores como la falta de acceso, el desconocimiento, y el estigma social. Asimismo, existe una creciente presencia de problemas relacionados con la ansiedad, el estres y la depresion en jovenes y universitarios, mientras que el acceso a servicios de atencion puede resultar insuficiente, costoso o poco accesible.

Ante esta problematica, surge la necesidad de contar con herramientes digitales accesibles que permitan realizar una primera autoevaluacion y obtener informacion orientativa sobre el bienestar emocional.

4. Justificación

MindClarity busca facilitar el acceso a una herramienta digital gratuita que permita a los usuarios conocer aspectos relacionados con su bienestar emocional de manera sencilla y rápida. El proyecto busca promover una mayor conciencia sobre la importancia de la salud mental y orientar al usuario hacia la búsqueda de apoyo profesional cuando los resultados indiquen que podría ser necesario.

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web de autoevaluación psicológica basada en la escala DASS-21 para instituciones educativas, que permita a los estudiantes obtener resultados por subescala, dar seguimiento a su evolución emocional y acceder a especialistas según la severidad de los resultados.

5.2. Objetivos Específicos

- Analizar el proceso actual de atención psicológica en instituciones educativas y las dificultades de acceso a herramientas de autoevaluación estandarizadas, para establecer una línea base sobre las necesidades de los usuarios.
- Diseñar la arquitectura de la plataforma y el modelo de base de datos en PostgreSQL para almacenar y organizar la información de pacientes, especialistas, administradores, evaluaciones y resultados históricos.
- Implementar un sistema de registro, inicio de sesión y control de acceso por roles que diferencie las funciones de pacientes, especialistas y administradores.
- Desarrollar el módulo de autoevaluación DASS-21, incluyendo las 21 preguntas clínicas, la validación de respuesta única por ítem y el cálculo automático de las puntuaciones por subescala (depresión, ansiedad y estrés).
- Implementar el módulo de historial emocional que permita al usuario consultar sus resultados anteriores y visualizar su evolución en el tiempo mediante gráficos.
- Implementar el módulo de búsqueda de especialistas que permita filtrar por especialidad, consultar el perfil profesional y solicitar una cita según disponibilidad.

- Ejecutar el desarrollo del proyecto en 18 semanas académicas, siguiendo la planificación por fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre.

6. Alcance

El alcance del proyecto comprende la definición de los **Procesos de Negocio**, los **Módulos Técnicos, organizados** de manera jerárquica para la versión académica del sistema web responsivo.

6.1. Procesos de Negocio

- **Proceso de Autenticación y Control de Usuarios:** Registro de pacientes, especialistas y administradores con validación estricta de credenciales y control de acceso basado en roles.
- **Proceso de Evaluación DASS-21:** Presentación interactiva de las 21 preguntas clínicas, validación de respuesta única por ítem y procesamiento inmediato de respuestas.
- **Proceso de Diagnóstico Automático:** Algoritmo de cálculo de puntuaciones para las subescalas de Depresión, Ansiedad y Estrés, con emisión de recomendaciones orientativas según el nivel de severidad obtenido.
- **Proceso de Seguimiento Histórico:** Almacenamiento cronológico de resultados y generación de gráficos de evolución emocional del usuario a lo largo del tiempo.
- **Proceso de Búsqueda y Agendamiento de Especialistas:** Filtrado de profesionales por área de especialidad y canal de solicitud de citas según disponibilidad.

6.2. Módulos Técnicos

- **Módulo 1 — Landing Page Informativa:**

  Presentación institucional de MindClarity, explicación del test DASS-21, reconocimiento a los autores (Lovibond & Lovibond) y avisos legales/descargos de responsabilidad.

- **Módulo 2 — Autenticación y Registro:**

  Creación de cuenta, inicio de sesión (login), recuperación de contraseña y gestión de permisos por rol, desarrollado en PHP con manejo seguro de sesiones.

- **Módulo 3 — Cuestionario DASS-21:**

  Interfaz de evaluación interactiva construida con HTML, CSS y JavaScript, validada para evitar omisiones de preguntas y con reporte de resultados en tiempo real.

- **Módulo 4 — Gestión de Perfiles:**

  Paneles de administración independientes para:

  - **Pacientes:** Gestión de datos personales e historial.
  - **Especialistas:** Configuración de perfil profesional y disponibilidad horaria.
  - **Administradores:** Gestión global de cuentas y roles.

- **Módulo 5 — Historial Emocional:**

  Registro de evaluaciones previas con opciones de filtrado por fecha y visualización gráfica de tendencias emocionales (JavaScript y librerías gráficas).

- **Módulo 6 — Búsqueda de Especialistas:**


  Catálogo de psicólogos con filtros integrados, vista detallada del perfil profesional y canal directo para solicitud de citas.

7. Cronograma

El proyecto MindClarity se desarrolla a lo largo de 18 semanas académicas correspondientes al ciclo académico del curso.

- Fecha de inicio: Semana 1
- Fecha de finalización: Semana 18
- Duración total: 18 semanas (4.5 meses)


7.1. Diagrama de Gantt

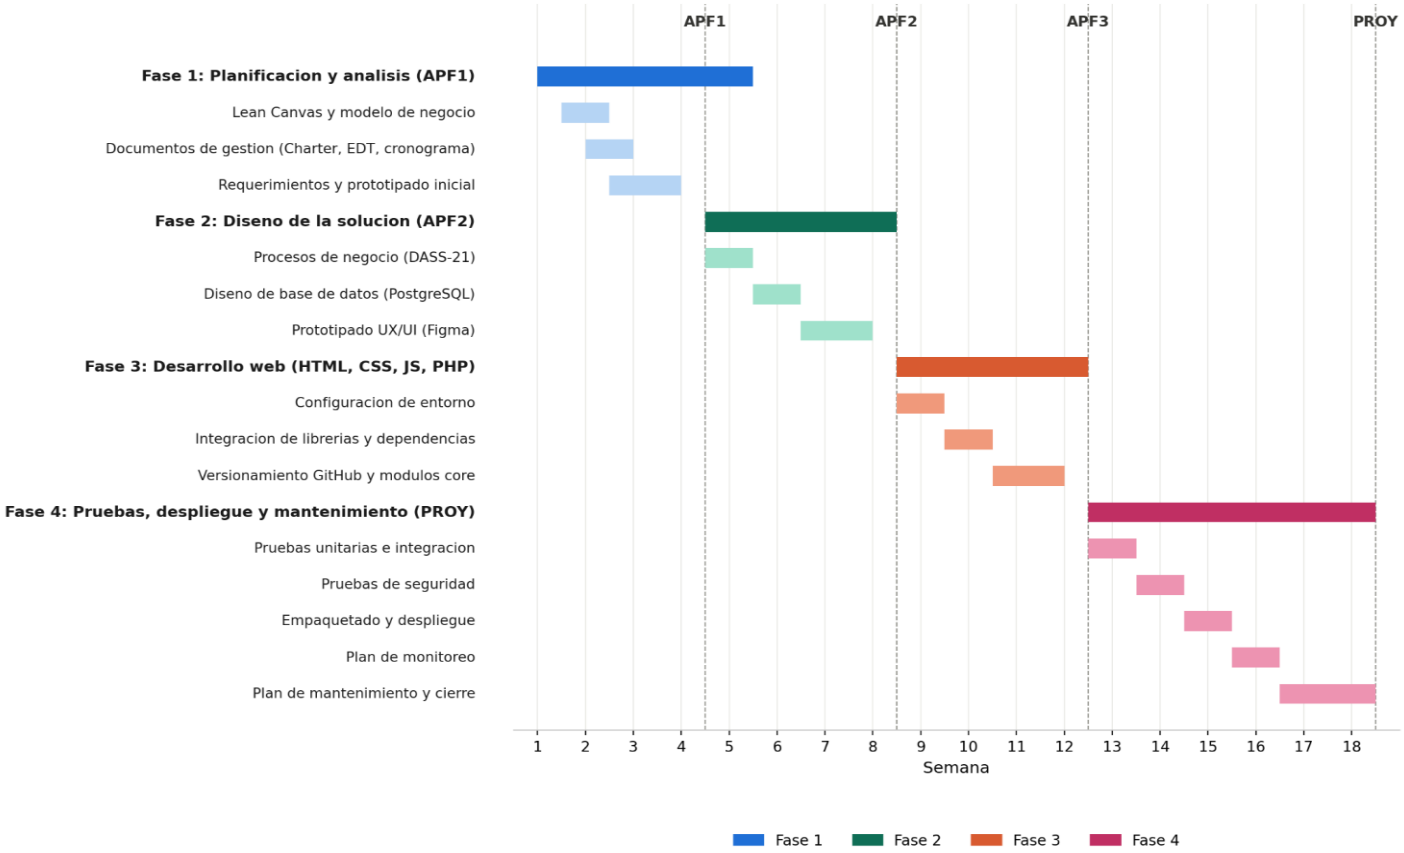

8. Costos

Recursos	Costo mensual (USD)	Costo total 4.5 meses (USD)
Desarrollo y mantenimiento de la app	$1,200	$5,400
Infraestructura cloud y seguridad de datos	$350	$1,575
Soporte legal y privacidad	$250	$1,125
Supervisión de psicólogos para voluntarios	$500	$2,250
Marketing digital y ventas	$550	$2,475
Honorarios de facilitadores y contenido educativo	$500	$2,250
Total	**$3,350**	**$15,075**

9. Actividades o tareas

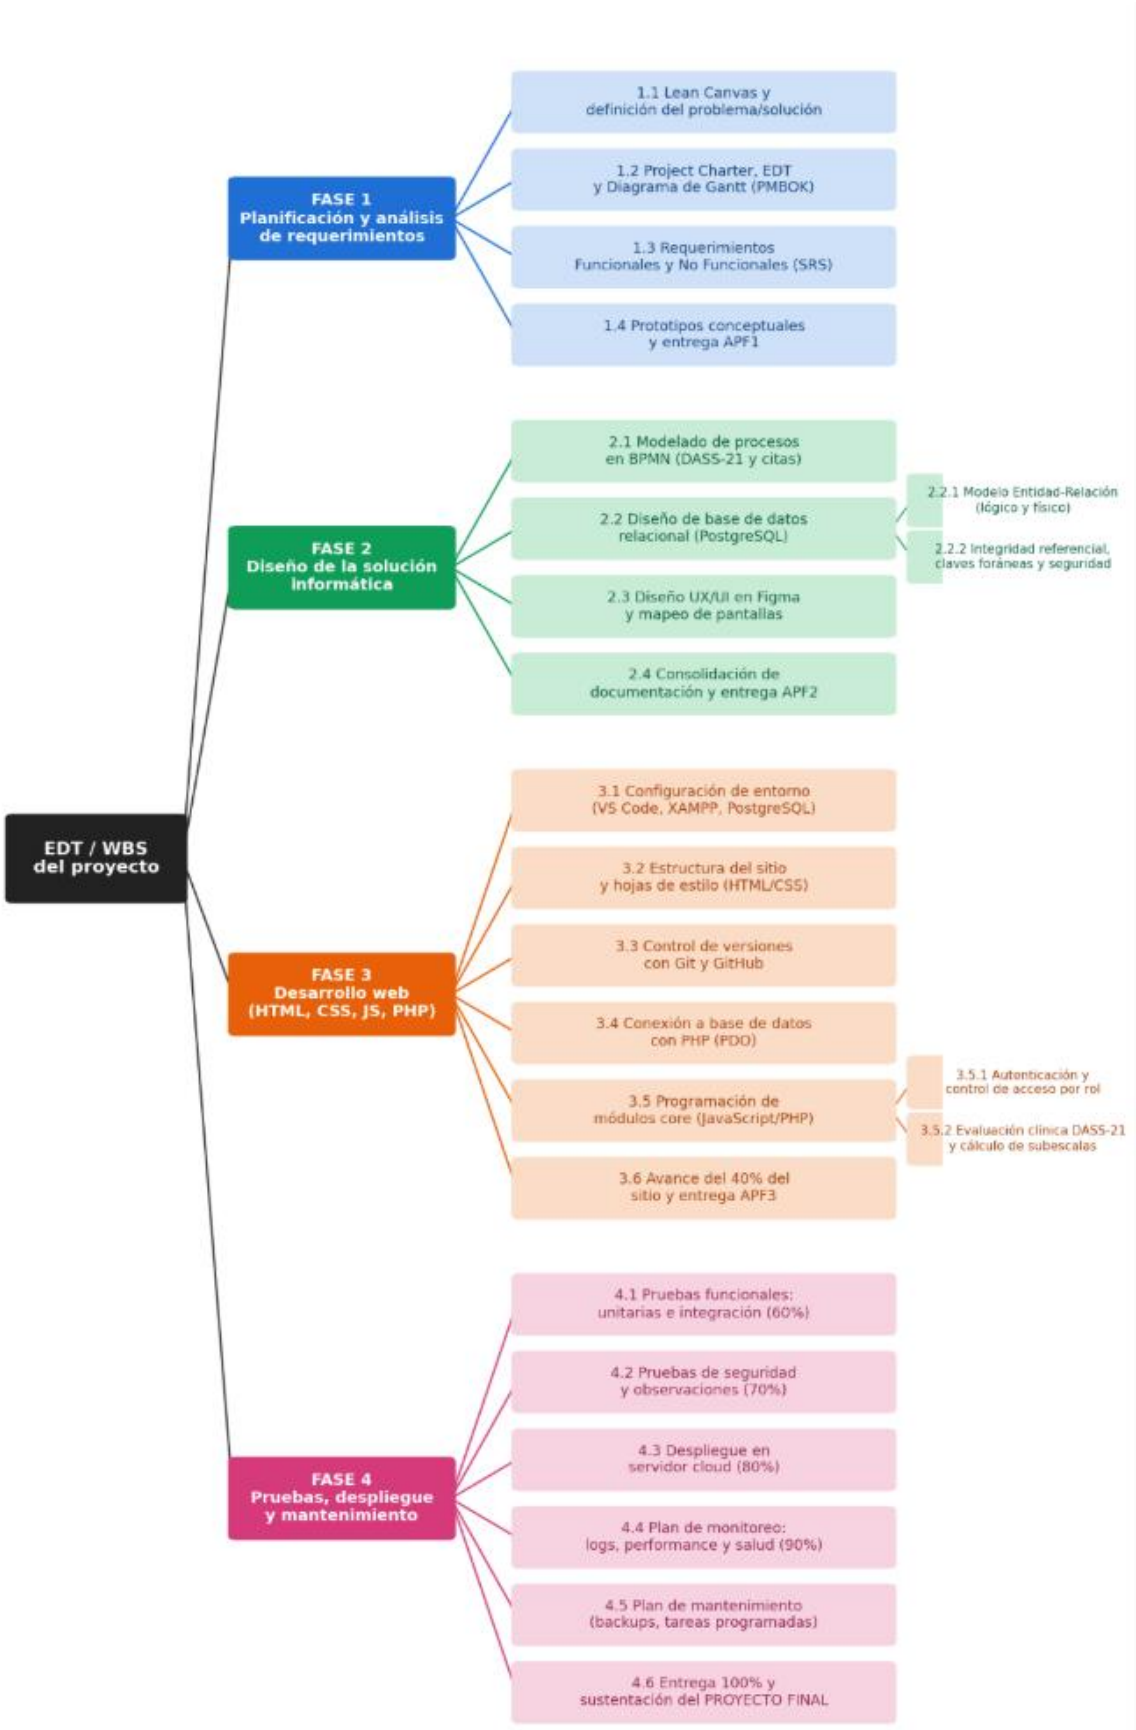

10. Recursos

10.1. Humanos

- Cahuana Luis Alessandro Javier
- Cerrinos Valverde Jordan Alexis
- Parrales Mejía David Jair
- Pérez Ramírez Darrell Jerome
- Murga Leon Kevin Eduardo
- Villanueva Poma Ronaldinho Williams

- **Supervisores Externos:** Docente de la asignatura (revisión técnica) y Asesor Temático (Psicólogo consultor para la validez de las escalas del DASS-21).

10.2. Materiales

- **Entorno de Desarrollo:** Visual Studio Code con extensiones para HTML/CSS, JavaScript (ESLint) y PHP Intelephense.
- **Servidor Local de Pruebas:** XAMPP como entorno local para PHP, con Apache y conexión configurada hacia PostgreSQL.
- **Sistema Gestor de Base de Datos:** PostgreSQL (utilizando pgAdmin para administración y consultas SQL).
- **Lenguajes y Tecnologías Core:** HTML5, CSS3 y JavaScript para la interfaz y funcionalidades del lado del cliente; PHP para la lógica del servidor y la conexión con la base de datos.
- **Framework de Estilos:** Bootstrap para maquetación responsiva y componentes de interfaz.
- **Gestión de Dependencias:** Composer para la gestión de librerías PHP del proyecto.
- **Control de Versiones y Repositorio:** Git y GitHub.
- **Herramienta de Diseño e Interfaces:** Figma.
- **Servidores y Pruebas:** Hosting/VPS con PostgreSQL en la nube, herramientas de Testing manuales y OWASP ZAP para auditorías de seguridad.

11. Responsables

11.1. Roles Asignados

- **Líder de Proyecto / Project Manager:** Parrales Mejía David Jair
- **Analista de Sistemas / Diseñador UX-UI:** Cerrinos Valverde Jordan Alexis
- **Arquitecto de Software:** Cahuana Luis Alessandro Javier
- **Especialista en Base de Datos (PostgreSQL):** Pérez Ramírez Darrell Jerome
- **Desarrollador Frontend:** Murga Leon Kevin Eduardo
- **Especialista QA & DevOps:** Villanueva Poma Ronaldinho Williams

Integrantes	Horas / semana	Semanas	Horas Totales
Cahuana	6	18	108
Cerrinos	5	18	90
Parrales	7	18	126
Pérez	6	18	108
Murga	7	18	126
Villanueva	5	18	90
TOTAL, DEL PROYECTO	**36**	**—**	**648 h**

11.2. Matriz RACI

Entregable / Actividad	Cahuana (PM)	Cerrinos (UX/UI)	Parrales (Arquitecto)	Pérez (DB)	Murga (Frontend)	Villanueva (QA/DevOps)
Lean Canvas y Project Charter	A	R	C	C	I	I
Especificación de requerimientos (RF/RNF)	A	C	C	C	C	I
Diagramas de procesos BPM	A	C	C	I	I	I
Diseño lógico/físico de BD en PostgreSQL	A	C	C	R	I	I
Prototipado UX/UI en Figma	A	I	I	I	C	I
Arquitectura del sistema (HTML, CSS, JS, PHP)	A	I	R	C	C	I
Desarrollo del cuestionario DASS-21 (frontend)	A	C	I	I	R	I
QA, control de versiones y despliegue cloud	A	I	C	I	C	R

R Responsable A Aprobador C Consultado I Informado

12. Acta de Constitución del Proyecto

Esto resume el acta de constitución del proyecto, documento que autoriza formalmente su desarrollo y establece de manera resumida su alcance general, su equipo, su duración y sus principales supuestos y restricciones.

Project Charter	
Empresa/Organización	MindClarity
Título del Proyecto	Plataforma Web de Autoevaluación Psicológica MindClarity para Instituciones Educativas
Patrocinador del Proyecto	Dr. Johan Max Alexander Lopez Heredia
Gerente del Proyecto	Parrales Mejía David Jair
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en desarrollar una plataforma web que permita a estudiantes de instituciones educativas realizar una autoevaluación psicológica basada en la escala DASS-21, obtener resultados inmediatos por subescala (depresión, ansiedad y estrés), dar seguimiento a su evolución emocional en el tiempo y acceder a especialistas según la severidad de los resultados. El sistema incorpora control de acceso por roles (paciente, especialista, administrador), un módulo de historial emocional con gráficos de evolución y un módulo de búsqueda y agendamiento de especialistas, desarrollado en HTML, CSS, JavaScript y PHP, con base de datos PostgreSQL.
Resumen del Cronograma Fecha Final	El plazo de ejecución del proyecto es de 18 semanas académicas: • Inicio del Proyecto: 07/09/2026 • Fin del Proyecto: 11/01/2027

14. Lienzo Canva

<table>
<tr>
<td rowspan="2">SOCIOS CLAVE
• Instituciones Educativas y facultades con áreas de bienestar estudiantil.
• Consultorios y clínicas de psicología.
• Lovibond & Lovibond (autores del DASS-21)</td>
<td>ACTIVIDADES CLAVE
• Cálculo clínico del DASS-21 y su mantenimiento.
• Gestión de cuentas, sesiones seguras y control de acceso por rol.
• Marketing de contenidos sobre salud mental.</td>
<td rowspan="2">PROPUESTA DE VALOR
• Autoevaluación DASS-21 gratuita, en menos de 5 minutos, sin cita previa.
• Resultado inmediato por subescala (depresión, ansiedad, estrés) con recomendación y, en severidad relevante, derivación profesional.
• Historial personal con gráficos de evolución en el tiempo.
• Herramientas diarias de seguimiento emocional (diarios, ejercicios de mindfulness, rutinas).</td>
<td>RELACIONES CON CLIENTES
• Cuenta y soporte dedicados para el responsable institucional.
• Comunidad de apoyo horizontal, empatía entre pares, anonimato garantizado y acompañamiento automatizado con alertas de riesgo.</td>
<td rowspan="2">SEGMENTOS DE CLIENTES
• Instituciones Educativas preocupados por el bienestar integral y el rendimiento académico de sus estudiantes.</td>
</tr>
<tr>
<td>RECURSOS CLAVE
• Equipo de psicólogos educacionales y expertos en pedagogía.
• Instrumento clínico DASS-21, de dominio público y sin costo de licencia.</td>
<td>CANALES
• Anuncios en Redes Sociales.
• Eventos de Salud mental.
• reuniones ejecutivas con directores/rectores</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">ESTRUCTURA DE COSTOS
• Desarrollo y mantenimiento de la app: $1,200 USD / mes
• Infraestructura cloud y seguridad de datos: $350 USD / mes
• Soporte legal y privacidad: $250 USD / mes
• Supervisión de psicólogos para voluntarios: $500 USD / mes
• Marketing digital y ventas: $550 USD / mes
• Honorarios de facilitadores y contenido educativo: $500 USD / mes (Total estimado: ~$3,350 USD / mes)</td>
<td colspan="2">FLUJOS DE INGRESOS
• Licencias anuales B2B para entidades educativas: $2,500 USD / institución al año
• Programas de capacitación por módulos: $600 USD / módulo
• Talleres presenciales y virtuales: $350 USD / taller
• Venta de kit de manuales y protocolos institucionales: $150 USD / licencia</td>
</tr>
</table>

15. Gestión de Riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Plan de contingencia	Responsable
Retraso en la validación clínica del DASS-21 por parte del asesor psicólogo.	Media	Alto	Agendar la revisión con al menos 2 semanas de anticipación y mantener un canal de comunicación directo; de persistir el retraso, usar la validación bibliográfica original (Lovibond & Lovibond) como respaldo temporal.	Cahuana (PM)
Fallas de seguridad en la conexión PHP–PostgreSQL (inyección SQL, exposición de datos sensibles).	Media	Alto	Uso obligatorio de sentencias preparadas (PDO), cifrado de contraseñas y auditoría con OWASP ZAP antes de cada despliegue.	Pérez (DB) / Villanueva (QA)
Indisponibilidad o caída del servidor cloud/hosting durante pruebas o sustentación.	Baja	Alto	Contratar un plan de hosting con SLA de disponibilidad, mantener respaldo local del sitio y backups periódicos de la base de datos.	Villanueva (QA/DevOps)
Incompatibilidad entre navegadores o dispositivos en la interfaz (HTML/CSS/JS).	Media	Medio	Pruebas cruzadas en los navegadores y resoluciones más usados, y uso de Bootstrap para asegurar diseño responsivo.	Murga (Frontend)
Sobrecarga de tareas en el equipo por ser un proyecto académico con tiempo limitado (18 semanas).	Alta	Medio	Redistribuir tareas según la Matriz RACI, priorizar el alcance mínimo viable (MVP) y usar el fondo de contingencia del presupuesto si se requiere apoyo externo.	Cahuana (PM)

16. Requerimientos Funcionales

LandingPage:

- RF01 - El sistema deberá mostrar una página de inicio con información general sobre MindClarity.
  RF02 - El sistema deberá explicar qué es el DASS-21 y cuál es su finalidad.
- RF03 - El sistema deberá mostrar información sobre los autores del DASS-21, Sydney Harold Lovibond y Peter Frank Lovibond.
- RF04 - El sistema deberá incluir una advertencia indicando que la autoevaluación no sustituye una evaluación profesional.
- RF05 - El sistema deberá permitir al visitante navegar hacia las opciones de registro e inicio de sesión
- RF06 - El sistema deberá mostrar información sobre la posibilidad de recibir recomendaciones y sugerencias de atención profesional según los resultados.

Registrar:

- RF01 - El sistema deberá permitir a un visitante crear una cuenta.
- RF02 – El sistema deberá verificar los datos del usuario y validar los campos.
- RF03 - El sistema deberá permitir posteriormente iniciar sesión con las credenciales registradas.

Iniciar Sesión:

- RF01 - El sistema deberá permitir a los pacientes/administradores/especialistas registrados iniciar sesión
- RF02 - El sistema deberá solicitar correo electrónico y contraseña y validar las credenciales.
- RF03 - El sistema deberá informar al usuario cuando las credenciales sean incorrectas.

Cuestionario DASS-21:

- RF01 – El sistema deberá permitir al usuario autenticado iniciar el cuestionario.
- RF02 – Solo se permitira seleccionar una única respuesta por pregunta.
- RF03 – El sistema deberá impedir continuar el cuestionario si la pregunta no es contestada.
- RF04 – El sistema mostrara el resultado del cuestionario una vez terminada.

Perfil del Paciente/Administrador/especialista:

- RF01 - El usuario/especialista deberá poder visualizar su información personal.
- RF02 - El usuario/especialista deberá poder modificar los datos personales permitidos.
- RF03 - El usuario deberá poder acceder a su historial de evaluaciones.
- RF04 - El usuario/administrador/especialista deberá poder cerrar sesión desde su perfil.
- RF05 – El especialista podrá indicar su disponibilidad para atención.
- RF06 - El administrador deberá poder acceder a un panel de administración.
- RF07 - El administrador deberá poder gestionar cuentas de usuarios/especialistas.

Historial:

- RF01 - El sistema deberá almacenar cada evaluación DASS-21 realizada por el usuario.
- RF02 - El usuario deberá poder consultar sus resultados anteriores.
- RF03 - El sistema deberá mostrar la evolución de los resultados a lo largo del tiempo.
- RF04 - El sistema deberá proporcionar recomendaciones relacionadas con la evolución observada.

Búsqueda de especialistas:

- RF01 - El sistema deberá permitir al usuario buscar especialistas disponibles.
- RF02 - El sistema deberá permitir filtrar especialistas por especialidad.
- RF03 - El sistema deberá mostrar el perfil profesional del especialista.
- RF04 - El sistema deberá permitir al usuario solicitar o gestionar una cita con un especialista con disponibilidad.

17. Requerimientos No funcionales

LandingPage:

- RNF01 - La página deberá presentar una interfaz clara, intuitiva y comprensible para los usuarios.
- RNF02 - La página deberá ser responsiva y adaptarse a dispositivos móviles, tablets y computadoras
- RNF03 - La interfaz deberá mantener una identidad visual consistente con la finalidad de bienestar y evitar la fatiga visual.

Registrar:

- RNF01 - El sistema deberá proporcionar mensajes de validación claros.
- RNF02 – Todos los datos, deberán ser guardados correctamente en la Base de Datos.
- RNF03 - El formulario deberá ser accesible y coherente para cada usuario.

Iniciar Sesión:

- RNF01 – El sistema deberá impedir que los usuarios no registrados inicien sesión.
- RNF02 – El sistema deberá tener un sistema de recuperación de contraseña.
- RNF03 – El sistema deberá redirigir al cuestionario una vez iniciado sesión.

Cuestionario DASS-21:

- RNF01- Al finalizar, el sistema deberá calcular automáticamente las puntuaciones correspondientes a depresión, ansiedad y estrés.
- RNF02 - El sistema deberá mostrar al usuario sus resultados de forma clara y comprensible.
- RNF03 - El sistema deberá proporcionar recomendaciones de especialistas relacionadas con los resultados obtenidos.
- RNF04 - El sistema deberá guardar el resultado del cuestionario en el historial del usuario con la fecha y hora de realización.

Perfil del Paciente/Administrador/especialista:

- RNF01 - El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles.
- RNF02 - Un usuario no deberá poder acceder a información o funciones correspondientes a otro rol.

Historial:

- RNF01 - El historial deberá conservar la integridad de los resultados registrados.
- RNF02 – Los resultados deberán ser comprensibles y accesibles.
- RNF03 – La información histórica de cada paciente no deberá ser visualizada por ningún otro usuario sin el consentimiento del mismo.


Búsqueda de especialistas:

- RNF01 - Los resultados de búsqueda deberán mostrarse en un tiempo adecuado.
- RNF02 - La búsqueda deberá ser intuitiva y fácil de utilizar.
  RNF03 - Los filtros deberán poder combinarse sin generar resultados incorrectos.
- RNF04 – Los resultados de especialistas deben mostrar a especialistas con disponibilidad.


18. Monitoreo


Etapa PMBOK	Qué se monitorea	Indicador / Herramienta	Responsable
Inicio	Cumplimiento del Lean Canvas y el Project Charter frente a los objetivos planteados.	Checklist de aprobación del Charter Reunión de kickoff con el docente	Parrales, Cahuana, Perez, Murga, Villanueva, Cerrinos
Planificación	Avance del EDT, el cronograma (Gantt) y la asignación de responsabilidades (RACI).	% de tareas planificadas vs. registradas Revisión semanal de cronograma	Parrales
Ejecución	Avance real del desarrollo web (HTML, CSS, JS, PHP) frente a lo programado por sprint.	% de avance por módulo Tablero Kanban / GitHub Projects Commits en GitHub	Cahuana
Monitoreo y control	Calidad del código, cumplimiento de estándares y estado de las pruebas (unitarias, integración y seguridad).	N.º de errores detectados vs. resueltos Cobertura de pruebas Reporte de OWASP ZAP	Villanueva
Cierre	Verificación de entregables finales, documentación completa y sustentación del proyecto.	Checklist de entregables (100%) Acta de cierre firmada por el equipo	Cahuana (PM)
Postventa o garantía	Estabilidad del sistema en producción, disponibilidad del servidor y atención a incidencias reportadas.	Tiempo de actividad (uptime) Registro de incidencias y tiempo de respuesta Backups periódicos verificados	Villanueva (QA/DevOps)

19. Prototipo del Aplicativo

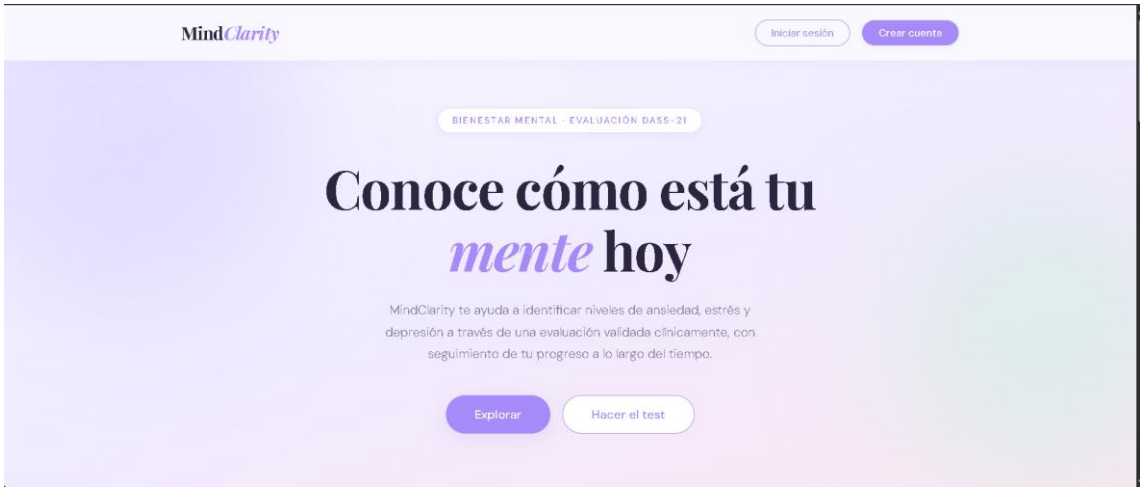



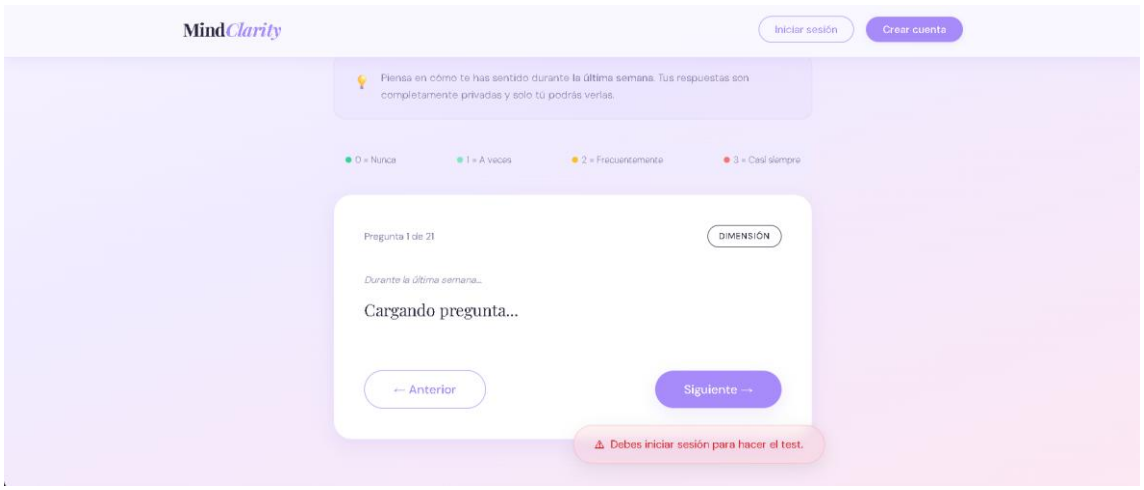

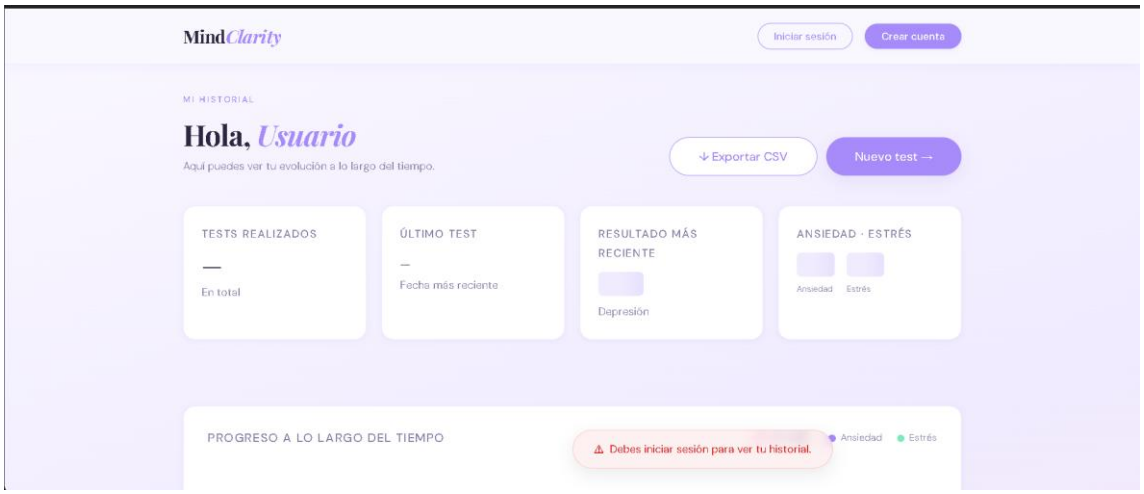
MindClarity
Iniciar sesión
Crear cuenta
MI HISTORIAL
Hola, Usuario
Aquí puedes ver tu evolución a lo largo del tiempo.
↓ Exportar CSV
Nuevo test →
TESTS REALIZADOS
—
En total
ÚLTIMO TEST
—
Fecha más reciente
RESULTADO MÁS RECIENTE
Depresión
ANSIEDAD · ESTRÉS
Ansiedad
Estrés
PROGRESO A LO LARGO DEL TIEMPO
⚠ Debes iniciar sesión para ver tu historial.
Ansiedad
Estrés

20. Referencias Bibliográficas

AI Complutense. (s. f.). *Guía del PMBOK: qué es, para qué sirve y cómo utilizarla*. AI Complutense.

https://aicomplutense.com/blog/guia-del-pmbok/

Nova Psych. (s. f.). *Escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21)*. Nova Psych. https://novopsych.com/es-us/evaluaciones/depresion/escala-de-depresion-ansiedad-y-estres-dass-21/

Ali, A. M., Alkhamees, A. A., Hori, H., Kim, Y., & Kunugi, H. (2021). The Depression Anxiety Stress Scale 21: Development and validation of the Depression Anxiety Stress Scale 8-Item in psychiatric patients and the general public for easier mental health measurement in a post COVID-19 world. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 18*(19), 10142. https://doi.org/10.3390/ijerph181910142

Arocutipa Patricio, E. (2022). Estudio de caso de una adolescente con episodio depresivo en un centro privado de Lima Metropolitana. Universidad Peruana Cayetano Heredia.


https://hdl.handle.net/20.500.12866/11616


Organización Mundial de la Salud. (2025, 29 de agosto). *Trastorno depresivo (depresión)*.


https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression

21. Anexos


7:56
33%
DAVID JAIR PARRALES MEJIA
DarrellJPR
IVAN ALEJANDRO LARA SANCHEZ
JORDAN ALEXIS CERRINOS VALVERDE
KEVIN EDUARDO MURGA LEON
ALESSA NDRO JAVIER ...

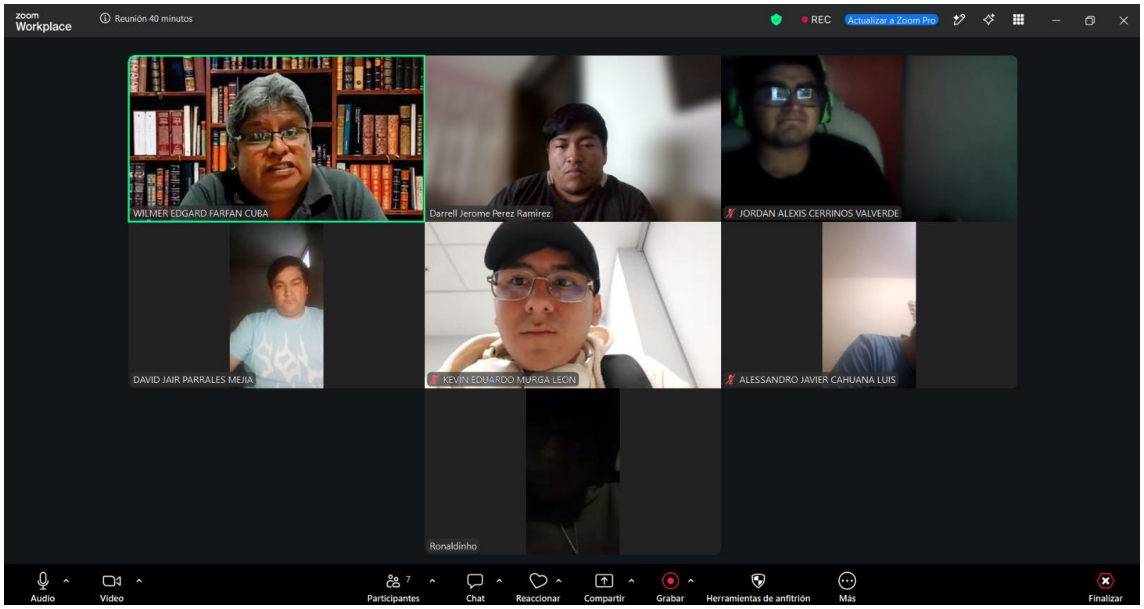
zoom Workplace
Reunión 40 minutos
REC
Actualizar a Zoom Pro
WILMER EDGARD FARFAN CUBA
Darrell Jerome Perez Ramirez
JORDAN ALEXIS CERRINOS VALVERDE
DAVID JAIR PARRALES MEJIA
KEVIN EDUARDO MURGA LEON
ALESSANDRO JAVIER CAHUANA LUIS
Ronaldinho
Audio
Video
Participantes
Chat
Reaccionar
Compartir
Grabar
Herramientas de anfitrión
Más
Finalizar

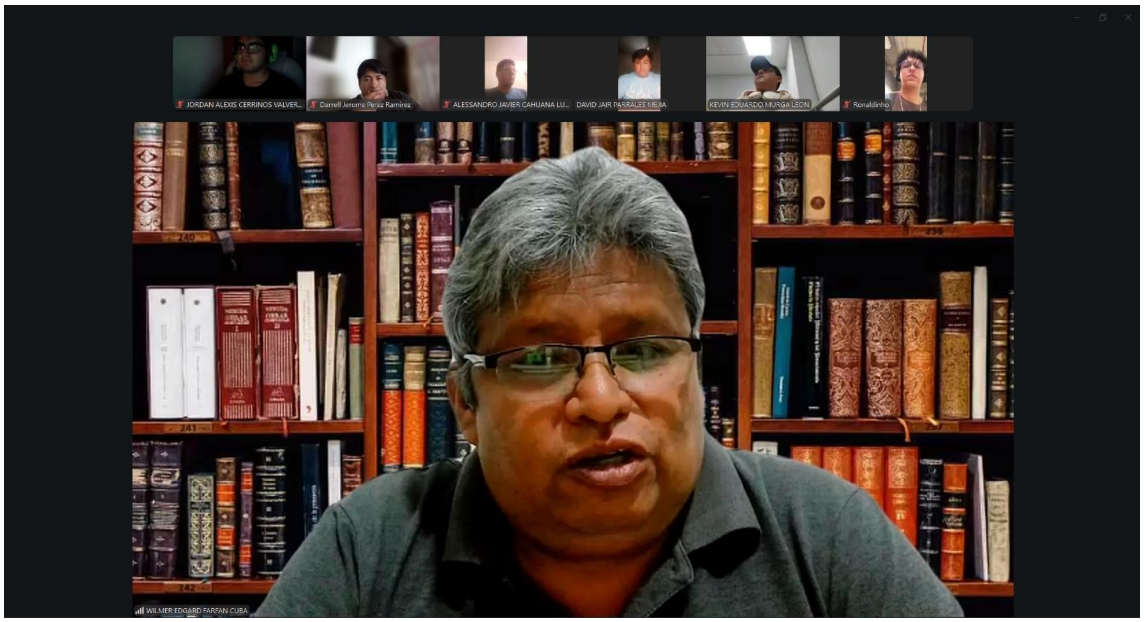
JORDAN ALEXIS CERRINOS VALVER...
Darrell Jerome Perez Ramirez
ALESSANDRO JAVIER CAHUANA LU...
DAVID JAIR PARRALES MEJIA
KEVIN EDUARDO MURGA LEON
Ronaldinho
WILMER EDGARD FARFAN CUBA

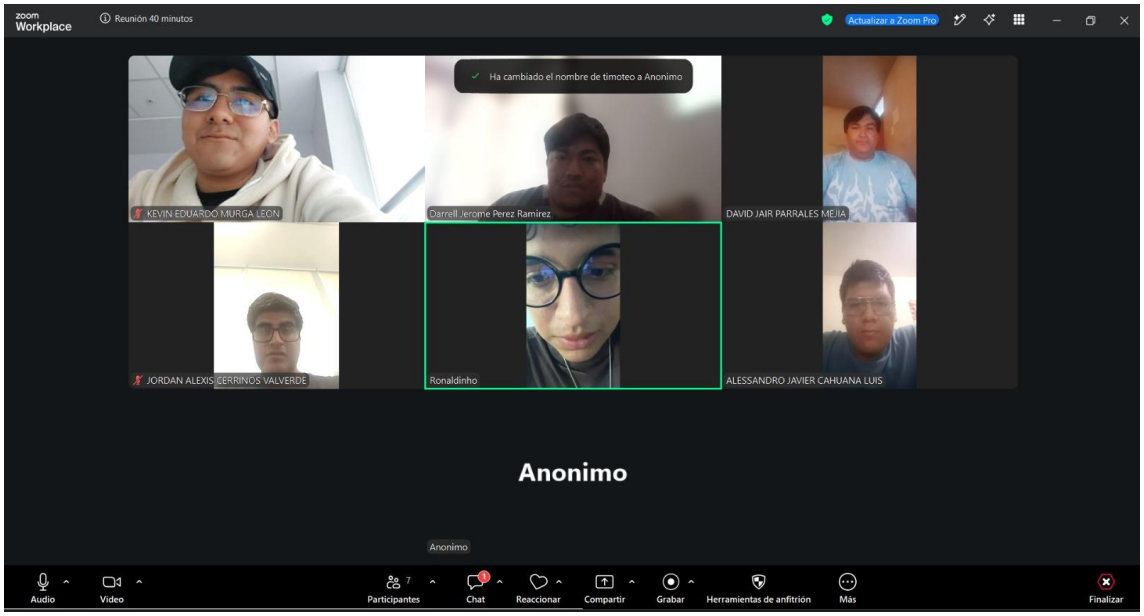
zoom Workplace
Reunión 40 minutos
Actualizar a Zoom Pro
Ha cambiado el nombre de timoteo a Anonimo
KEVIN EDUARDO MURGA LEON
Darrell Jerome Perez Ramirez
DAVID JAIR PARRALES MEJIA
JORDAN ALEXIS CERRINOS VALVERDE
Ronaldinho
ALESSANDRO JAVIER CAHUANA LUIS
Anonimo
Anonimo
Audio
Video
Participantes
Chat
Reaccionar
Compartir
Grabar
Herramientas de anfitrión
Más
Finalizar
